


SAP SRM on One Client with SAP ERP: Projektablauf

Wien, April 2014

SAP SRM on One Client: Projektablauf ohne Sandbox

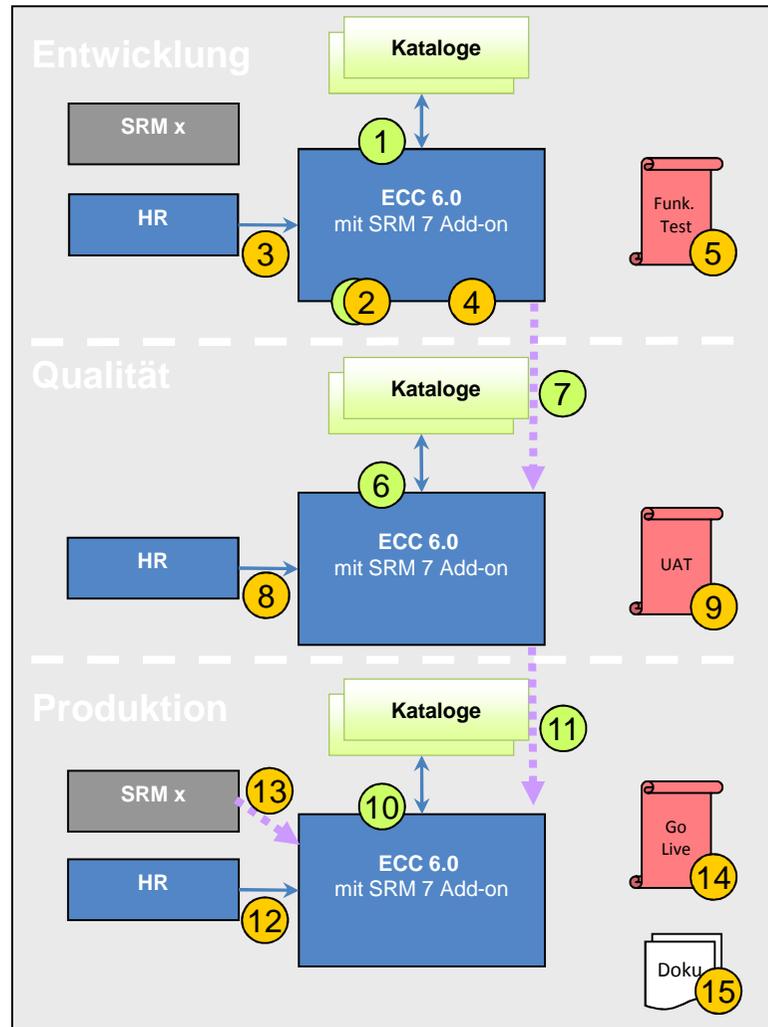

1. Installation SRM Add-on in der Entwicklungsumgebung, Hinweispflege und Anbindung Kataloge, sowie SICF-Tätigkeiten und Mail-Konfiguration
2. SRM 7.0 On One Client: Customizing, Konfiguration
3. Initialer Transfer Org.-Struktur von HR auf ERP-System und Erweiterung Deltaabgleich. Attributanpassung aus SRM-Altsystem (Netzplanvorgänge, Aufträge).
4. Entwicklungen/Customizing: BAdI-Anpassungen, (Kundenfelder) Stammdatensynchronisierung, Nummernkreise, Konfiguration NWBC und Mail-Inbound-Verarbeitung, Pflege der Benutzerrollen und User-Zuordnung
5. Funktionaler Test (Use Cases)
6. Installation SRM Add-on, sowie SICF-Tätigkeiten und Mail-Konfiguration, User-Rollen-Zuordnung
7. Import Transportaufträge ins QS-System und manuelle Nacharbeiten
8. Transfer Org.-Stuktur von HR auf ERP-System und manuelle Tätigkeiten zur Org.-Struktur
9. User Acceptance Test zur Abnahme am QS-System (Use Cases)
10. Installation SRM Add-on, sowie SICF-Tätigkeiten und Mail-Konfiguration, User-Rollen-Zuordnung
11. Import Transportaufträge ins Produktivsystem und manuelle Nacharbeiten
12. Transfer Org.-Stuktur von HR auf ERP-System und manuelle Tätigkeiten zur Org.-Struktur
13. Archivierung abgeschlossener Einkaufswägen inkl. Workflow-Protokoll als PDF an Bestellungen
14. GoLive-Vorbereitungstätigkeiten → GoLive → HyperCare
15. Erstellung Dokumentation (Customizing und Techn. Doku) und System-Übergabe

Legende:

- SAP Basis-Tätigkeit
- Tätigkeit SRM-Projektteam

SAP SRM on One Client: Zeitplan

Tätigkeiten	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18
Unterstützung SAP-Basis	1	2	2				1				1				1			
Grundcustomizing und Stammdaten	1	2	2															
Datenreplikation, Initial-Load, HR-Anbindung, Katalog-Anbindung				2	1													
User-Management und Lieferantenreplikation				1	1													
BAdI-Implementierungen, Zusatzprogrammierungen					1	1												
Implementierung Genehmigungs-Workflows					1	1	1	2										
Implementierung Zusatzfunktionalitäten						1	1	1										
Milestone: Freigabe Test-Umgebung									◆									
Workshops und Durchführung der funktionalen Tests									3	2	1							
Vorbereitung UAT und Unterstützung Testteam												2						
Vorbereitung und Durchführung UAT													2	2				
Erstellung der Projektdokumente																		
Milestone: Abnahme															1	◆		
GoLive-Vorbereitung und GoLive																1	◆	
Nacharbeiten und Nachbetreuung																	1	1
